



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Director: Ricardo José Castro Irigorri

Subdirectora de inversión pública: Lina María Sarria

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – SPI

Gianna Storino Angel



¿Por qué es importante hacer seguimiento a la inversión pública?

El seguimiento a la inversión pública **busca describir si el Estado esta produciendo y entregando los bienes y servicios públicos de acuerdo con una programación estimada y unos recursos asignados para dicho propósito.** Además, apoya los procesos de evaluación para determinar si dichos bienes y servicios contribuyen a los cierres de brechas y a la estabilidad económica.

Fuente: DNP

Características del Proceso de Seguimiento a la inversión

- Es continuo.
- Es realizado durante la etapa de ejecución del programa o proyecto.
- Describe lo que ha avanzado un programa o proyecto frente a lo programado en su formulación (no busca establecer causalidad).
- Genera alertas tempranas para introducir correcciones durante la ejecución del programa y/ proyecto o alcanzar mejores resultados.
- Brinda retroalimentación y aprendizaje sobre la ejecución de los programas o proyectos (Ortegón, 2008).
- Es realizado principalmente por la Gerencia del Proyecto.

Justificación legal para realizar seguimiento a programas y proyectos de inversión



La Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 343, como mandato el diseño y la organización de los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas, programas y proyectos implementados por el Gobierno Nacional...

DECRETO 3286 DE 2004

“Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública.”

ARTÍCULO 1°. “Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. Créase el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública como un conjunto integrado de procesos automatizados que permita evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública.”

Ley 152 de 1994

CAPÍTULO XII

Artículo 49º - 2. “El Departamento Nacional de Planeación, organizará y pondrá en funcionamiento un sistema de evaluación posterior del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades territoriales, que será coordinado, dirigido y orientado por el mismo Departamento.”

Decreto 111 de 1996

“Artículo 92: El Departamento Nacional de Planeación evaluará la gestión y realizará el seguimiento de los proyectos de inversión pública”

Decreto 1082 de 2015.

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.”

Decreto 1068 de 2015.


“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.”

Resolución de la Contraloría General de la Republica 0035 del 30 de abril de 2020 - ARTÍCULO 45. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y TERRITORIAL.

“Para el seguimiento de la inversión pública territorial, los departamentos, los distritos, los municipios y los resguardos indígenas, remitirán a la Contraloría General de la República, la información de los proyectos de inversión, cualquiera que sea la fuente de financiación, en la forma establecida por el DNP, y concordante con la información presupuestal reportada a través del CHIP.”

El seguimiento de la inversión pública

De acuerdo a la información de la línea base se registra el avance de los proyectos de inversión según las siguientes responsabilidades (reguladas por el decreto 1082 de 2015):

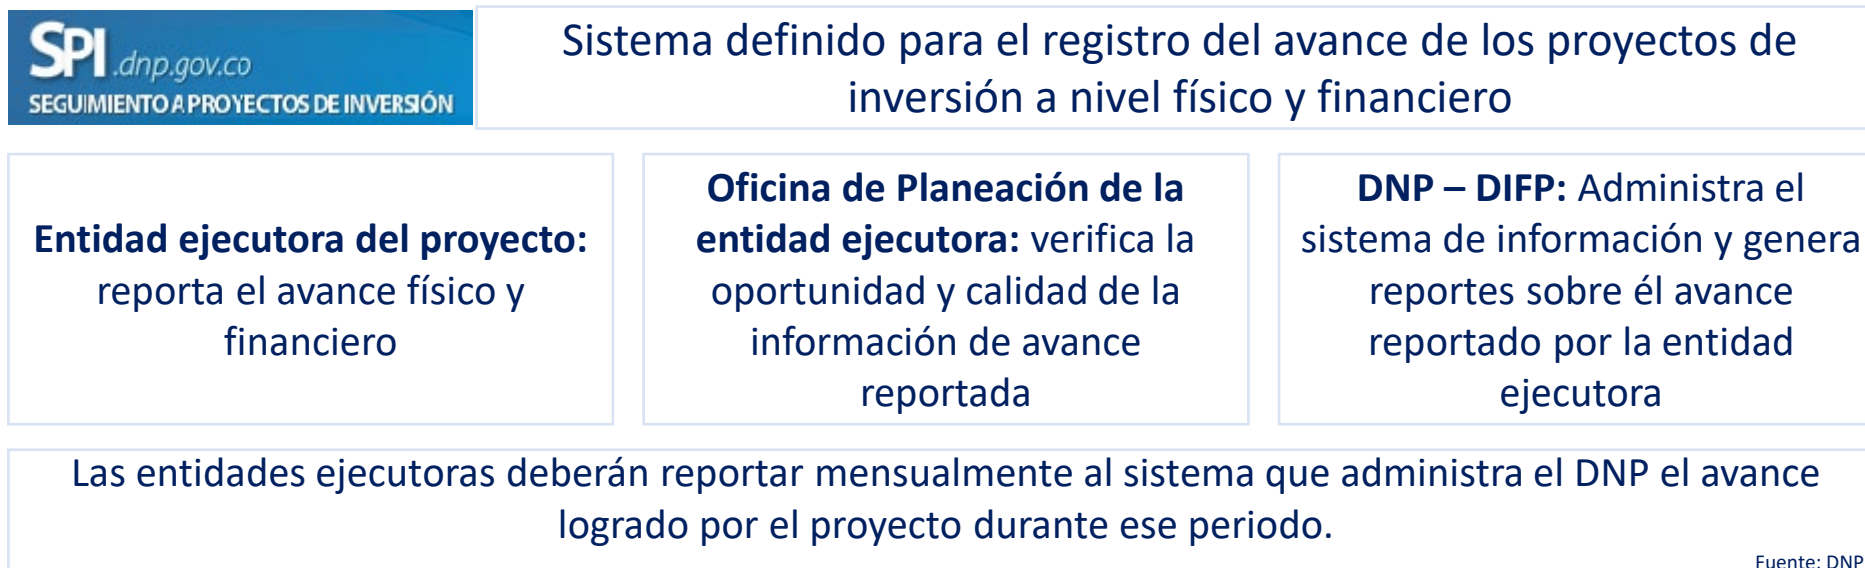

Fuente: DNP

Seguimiento de la inversión pública en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle

El banco de programas y proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca desde el año 2021 implementó el Seguimiento a los proyectos de inversión en la plataforma SPI.


A partir del primer trimestre del año 2021 se inició con el proceso de seguimiento mensual al reporte de dicha información compuesta por avance físico, de gestión y financiero de los proyectos asociados a las dependencias del Departamento.

Este seguimiento se compone de la verificación del cargue de la información correspondiente al avance acumulado logrado por cada proyecto durante el periodo. Verificamos que las dependencias cumplan con el reporte mensual de la información, si este no se realiza o los datos suministrados no son coherentes, se les envía un oficio notificándole a la Dependencia la inconsistencia para que sea subsanada en el siguiente periodo.

Recordemos que el reporte de información oportuno y veraz es responsabilidad y obligación de las entidades ejecutoras de los proyectos y es realizado por los responsables asignados por las entidades los primeros 5 días hábiles de cada mes.

¿Qué es SPI?

Es una herramienta desarrollada por el Departamento Administrativo de Planeación – DNP, que permite **registrar el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión** según lo establecido previamente durante su periodo de formulación y posteriores actualizaciones.

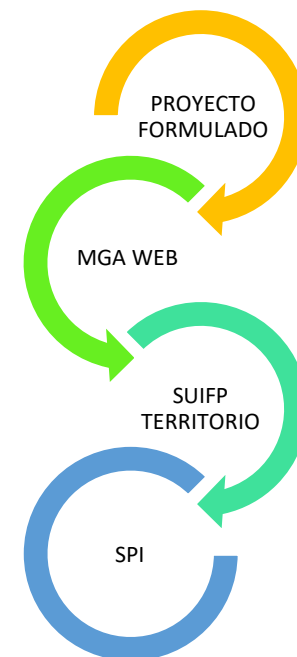

Características del SPI

- Facilita el control de la ejecución y la preparación de reportes
- Explica a los demás lo que sucede y por qué se logran o no los resultados esperados
- Compara los resultados esperados y el avance de los mismos
- Permite tomar decisiones durante la implementación del proyecto
- Constituye la base para la adopción de medidas correctivas
- Apoya los procesos de transparencia y rendición de cuentas

Metodología para hacer uso del SPI

- La dependencia deberá **asignar un responsable del Seguimiento** (Alguien que conozca muy bien el/los proyectos de inversión) y solicitar al Banco de programas y proyectos un usuario (si no lo tiene).
- El Administrador Local (usuario del Banco de Programas y Proyectos) creará el usuario a dicho responsable y le asignará el rol en SPI para que pueda acceder al registro del seguimiento.
- Una vez asignado el rol en SPI El responsable del seguimiento deberá:
 - Enviar sus datos (dependencia, nombre y usuario) mediante correo electrónico a segarzon@valledelcauca.gov.co o a spiplaneacionvalle@valledelcauca.gov.co y la relación de los proyectos a los cuales le hará el registro mensual incluyendo el código BPIN de los mismos para que los pueda visualizar en la bandeja de entrada del SPI.
 - Reportar los 5 primeros días hábiles del mes (mes vencido) la información correspondiente a cada uno de los proyectos que tiene a cargo.



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

El DNP le recuerda la importancia de conservar la confidencialidad de las contraseñas ya que estas permiten el acceso a los sistemas de información: Tenga en cuenta que...

- Las contraseñas son personales e intransferibles y su información no debe estar visible ni al alcance de otras personas.
- Debe cambiar la contraseña cada 60 días, no utilice claves usadas previamente.
- La contraseña debe tener al menos ocho (8) caracteres. Use combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales como ¡!"#\$%&'/()=?¡;><["]
- Absténgase de usar nombres propios de personas, mascotas, equipos deportivos, ni fechas significativas, o contraseñas tales como: Colombia2021-, QWE123", MARIA2023+ y similares.
- Absténgase de usar caracteres repetidos. Por ejemplo: AAAA, 1234 y similares.
- Absténgase de usar contraseñas con caracteres incrementales. Por ejemplo, MARIA1, MARIA2.

Para cambiar la contraseña en el aplicativo realice los siguientes pasos: [Instructivo cambio contraseña](#)



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Iniciar sesión

Tipo de documento de identificación *

Cedula

Número de documento de identificación *

Número de documento de identificación

Contraseña *

Ingresar

[Usuarios DNP](#)

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[Usuario anónimo](#)



1. Seleccionar tipo de Documento con que hizo el registro
2. Digitar el Numero de Identificación
3. Digitar la contraseña

* Campos requeridos



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

SPI *dnp.gov.co*
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas

1

Seguimiento Territorio

Ayuda Territorio

domingo, 03

Bienvenidos al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión



Notas de Interés

- Requerimientos Mínimos ([ver](#))
- Ahora puedes consultar la [Ficha EBI](#) del proyecto; ingresa por la opción Consultas - Proyectos.

MODELO DE SEGUIMIENTO

Actividades Productos Objetivos



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

SPI *dnp.gov.co*
SEGUIMIENTO A PROYEC

Consultas Territorio

Seguimiento Territorio

Ayuda Territorio

domingo, 03 de marzo de 2024

Registrar Seguimiento

Registrar Seguimiento

Consultar Seguimiento

Diagnóstico

2

Seguimiento Territorio

Bandeja de Entrada SPI



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Registrar Seguimiento

Registrar Seguimiento

Consultar Seguimiento

Diagnóstico

[Inicio](#) | [Seguimiento Territorio](#) | [Registrar Seguimiento](#) | [Registrar Seguimiento](#)

Registro



Código BPIN

Nombre del Proyecto

Entidad Territorial Entidad:

Responsable:

Vigencia Desde Período Febrero Periodicidad MENSUAL

Vigencia Hasta Período Febrero Periodicidad MENSUAL

Fecha límite de Registro de Información: 30/03/2024

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2020003760186 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	ABIERTO	21/12/2023 4:58:36 p. m.	2024 2-Febrero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	<input type="checkbox"/>

Total: 1

- Aquí se visualizan los proyectos que el Usuario tiene a cargo y activos para realizar el seguimiento.

Cerrar un proyecto ⚠



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Código BPIN:

Nombre del Proyecto:

Entidad Territorial: Entidad:

Responsable:

Vigencia Desde: Período: Enero Periodicidad: MENSUAL

Vigencia Hasta: Período: Enero Periodicidad: MENSUAL

Fecha límite de Registro de Información: 07/02/2022

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad	Cerrar Proyecto
2020003760060 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, VALLE DEL CAUCA	ABIERTO	27/10/2020 6:51:50 a. m.	2022 1-Enero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	<input type="checkbox"/>
2020003760186 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	ABIERTO	29/12/2021 3:43:19 p. m.	2022 1-Enero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	<input type="checkbox"/>

I


Total: 2

1. Clic en la opción de “cerrar proyecto”
2. Aparecerá un cuadro emergente donde se nos preguntará: “¿Está seguro que el proyecto ya terminó su ejecución? Una vez de clic en el botón guardar no podrá deshacer los cambios y ya no podrá registrar mas información en el proyecto por que este quedará cerrado para el registro de información.”
3. Si su proyecto finalizó la ejecución y no tendrá recursos programados o ejecución en futuros periodos puede proceder a cerrar y aceptar la información para que ya le aparezca como “cerrado” en su bandeja de entrada.
4. Nuevamente le aparecerá un cuadro emergente donde le indicará que el proyecto identificado con Código BPIN “#####” terminó el seguimiento.
5. Actualizamos el navegador

Proyecto "Cerrado"



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

SPI
dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas TerritorioSeguimiento TerritorioAyuda Territorio

viernes, 04 de febrero de 2022Entidad Usuario: Jesus Felipe Cifuentes Jaramillo
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Registrar Seguimiento

Registrar Seguimiento

Consultar Seguimiento

Diagnóstico

[Inicio](#) | [Seguimiento Territorio](#) | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Registro

Código BPIN

Nombre del Proyecto

Entidad Territorial: VALLEEntidad: VALLE

Responsable: Jesus Felipe Cifuentes Jaramillo

Vigencia Desde: 2022Periodo: 1EneroPeriodicidad: MENSUAL

Vigencia Hasta: 2022Periodo: 1EneroPeriodicidad: MENSUAL

Fecha límite de Registro de Información: 07/02/2022

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2020003760060 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, VALLE DEL CAUCA	CERRADO	27/10/2020 6:51:50 a. m.	2022 1-Enero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 03/02/2022 (Actualizado)	<input checked="" type="checkbox"/> 03/02/2022 (Actualizado)
2020003760186 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	ABIERTO	29/12/2021 3:43:19 p. m.	2022 1-Enero	2,00%	0,00%	5,98%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 03/02/2022 (Actualizado)	<input type="checkbox"/>

Bandeja Principal SPI


Si al ingresar al SPI no visualiza ningún proyecto, es porque no ha solicitado la asignación del mismo.

Para solicitar la asignación de un proyecto a un usuario responsable debe enviar un correo a segarzon@valledelcauca.gov.co o spiplaneacionvalle@valledelcauca.gov.co con los datos de la dependencia, el usuario responsable, el código Bpin y el nombre completo de los proyectos.

Una vez reciba la respuesta por parte del funcionario encargado de realizar este trámite deberá verificar en la plataforma que se hayan asignado de manera exitosa.

Bandeja Principal SPI

Tablero de Control

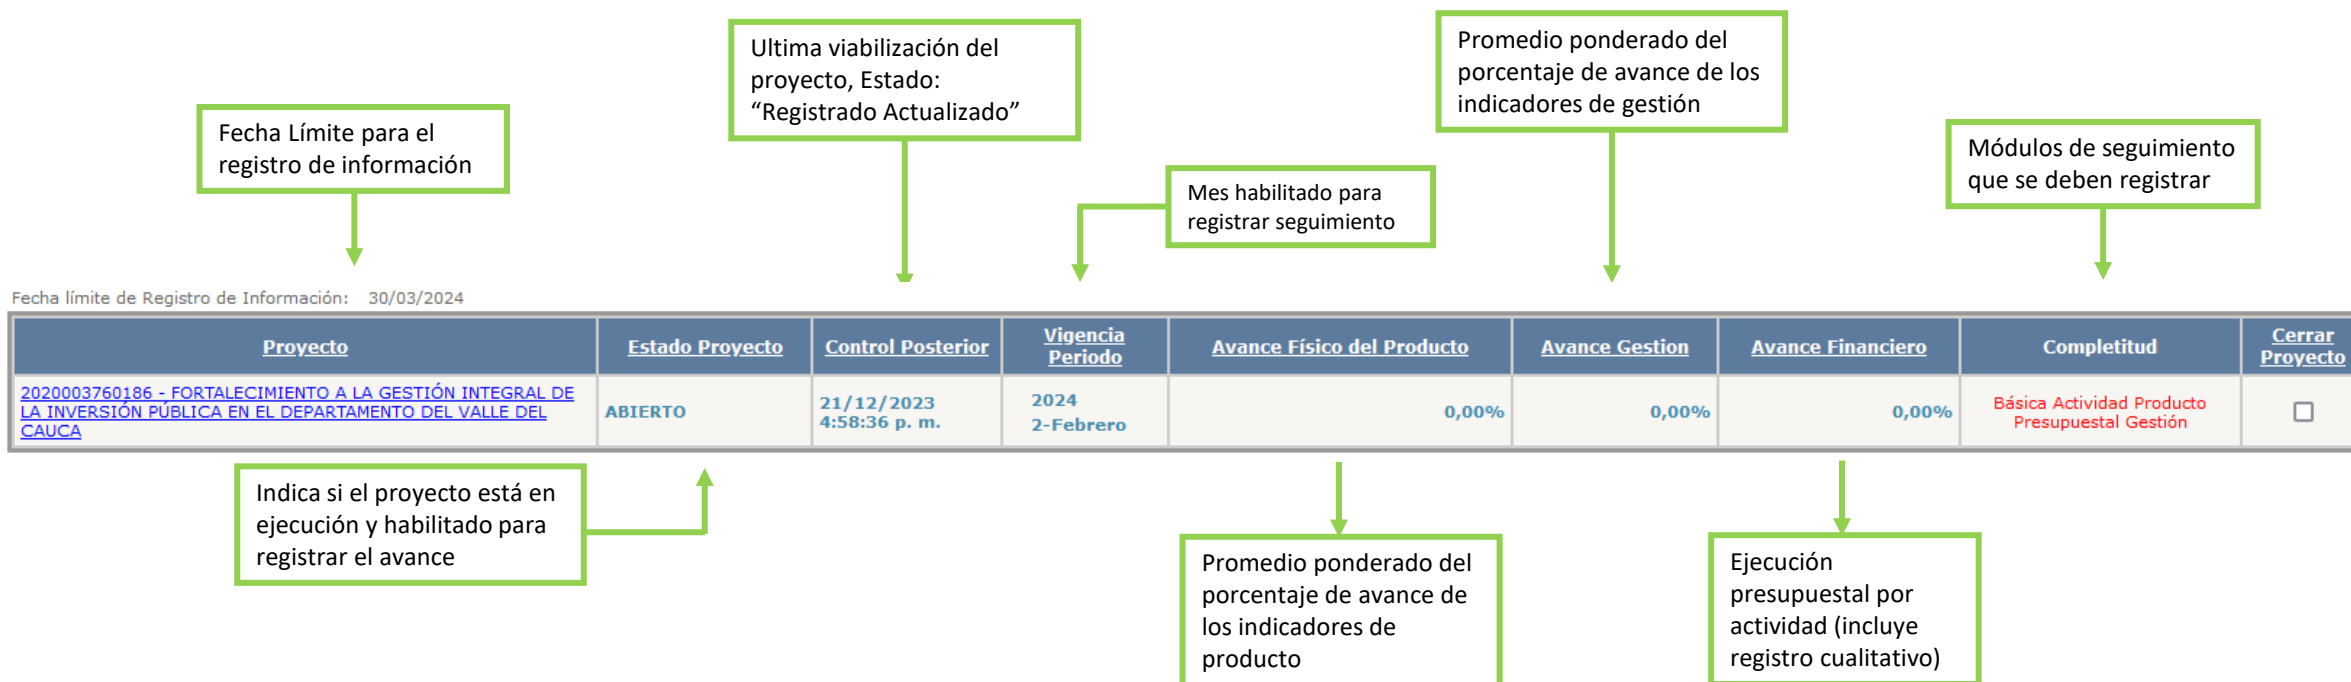

Bandeja Principal SPI



Registro



Código BPIN

Nombre del Proyecto

Entidad Territorial Entidad:

Responsable:

Vigencia Desde Periodo Febrero Periodicidad MENSUAL

Vigencia Hasta Periodo Febrero Periodicidad MENSUAL

Fecha límite de Registro de Información: 30/03/2024

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2020003760186 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	ABIERTO	21/12/2023 4:58:36 p. m.	2024 2-Febrero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupestal Gestión	<input type="checkbox"/>



Clic en el nombre del proyecto al cual le vamos a hacer seguimiento.

Validación de Información Básica



Datos Básicos del Proyecto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos




	<p>2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p> <p>Entidad Territorial: Entidad:</p> <p>Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00</p> <p>Responsable:</p> <p>Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.</p> <p>Fecha Límite de Registro: 30/03/2024</p> <p>Resumen Ejecutivo</p>	<p>2020 - 2024</p> <p>Periodo: 2024 - Febrero</p> <p>Ficha EB1(14/07/2021)</p>
---	---	--

Imagen [Cargar](#)

Resumen Ejecutivo ([Actualizar](#) [Borrar](#))

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

En este primer módulo cargamos/actualizamos:

- La imagen alusiva al proyecto en formato .jpg o .gif (max 21.000 Kb)
- El resumen ejecutivo (Documento elaborado para la consulta pública del estado, debe contener información relevante que evidencie todo lo relacionado con la ejecución del proyecto)

Resumen Ejecutivo



El Banco de Programas y Proyectos ha definido que los resúmenes ejecutivos de los proyectos se deben actualizar cada 6 meses. Para esto ha definido un formato de informe que describe de manera cualitativa y cuantitativa los resultados obtenidos a la fecha del proyecto de inversión según la meta o metas de producto asociadas al mismo.

Es muy importante que si cuentan con evidencias las incluyan dentro de este informe o las carguen en el modulo de anexos.

Datos Básicos



Rojo: falta registro – registro incompleto
Verde: reporte de seguimiento completo
Blanco: modulo de consulta

Datos Básicos del Proyecto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos




 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Imagen pendiente	<p>2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p> <p>Entidad Territorial: Entidad:</p> <p>Apropiacion Vigente 2024: \$11.365.700.000,00</p> <p>Responsable:</p> <p>Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.</p> <p>Fecha Límite de Registro: 30/03/2024</p> <p>Resumen Ejecutivo</p>	<p>2020 - 2024</p> <p>Periodo: 2024 - Febrero</p> <p>Ficha FBI(14/07/2021)</p>
--	---	--

Imagen Cargar

Resumen Ejecutivo (Act

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

1. Se debe Validar que la información (programa, subprograma presupuestal, objetivo general, descripción) corresponda a la información cargada previamente en SUIFP
2. Verificar el histórico de la ejecución financiera, avances físico, financiero y de gestión del proyecto
3. Verificar que la información sea correcta y coincida con la registrada en el SUIFP

1. Validación de Información General

Información General .. (clic para expandir)	
Programa	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
Subprograma	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Objetivo	Fortalecer la capacidad de gestión y planificación de la Subdirección de Inversión Pública SIP que permitan mejorar y ampliar las opciones de desarrollo socio-territorial del departamento del Valle del Cauca.
Descripción	<p>Las entidades públicas tienen la responsabilidad de conducir adecuadamente la asignación de los recursos, orientados a la maximización de los beneficios de la población impactada, optimizándolos y garantizando la sostenibilidad administrativa de la organización para su continuo funcionamiento.</p> <p>Por lo anterior, las entidades territoriales realizan un proceso de planificación y plasman en sus planes de desarrollo las estrategias para alcanzar el logro de sus objetivos, a fin de dar cumplimiento con los planes de gobierno y construir confianza ciudadana al dirigir y orientar eficazmente los planes, programas, proyectos, actividades y recursos, de tal manera que se dé cumplimiento con los fines esenciales del Estado.</p> <p>Es por ello que la gobernación del Valle del Cauca tiene como misión generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio; y de la administración efectiva de los recursos, para propiciar la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes con el fin de mejorar su calidad de vida.</p>
Resumen Avances .. (clic para expandir)	
Cadena de Valor .. (clic para expandir)	



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

2. Resumen Avances

Información General .. (clic para expandir)										
Resumen Avances .. (clic para expandir)										
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	Avance Financiero [Ⓢ]	Avance Físico [Ⓢ]	Avance Gestión [Ⓢ]	Avance Físico del Producto [Ⓢ]
2020-Dic	1.013.200.000	0	1.013.200.000	0	0	0	0%	N/A	0%	0%
2021-Dic	4.800.600.000	0	4.800.600.000	4.054.300.000	4.054.300.000	3.604.300.000	84,5%	N/A	100%	78%
2022-Dic	5.664.200.000	0	5.664.200.000	5.654.500.000	5.654.500.000	5.654.500.000	99,8%	N/A	100%	100%
2023-Dic	6.145.240.000	0	6.145.240.000	6.145.240.000	6.145.240.000	6.145.240.000	100%	N/A	100%	100%
2024-Feb	11.365.700.000	0	11.365.700.000	500.000.000	0	0	0%	N/A	0%	0%
Cadena de Valor .. (clic para expandir)										

3. Validación de Cadena de Valor

Cadena de Valor .. (clic para expandir)	
OBJETIVO: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión pública radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca.	
PRODUCTO: Documentos de evaluación	
Actividades del producto: <ul style="list-style-type: none">Realizar la <u>revisión, actualización, intervención y aplicación de los instrumentos archivísticos para la gestión documental del Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación.</u>Realizar el <u>monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión financiados y/o cofinanciados con recursos del PGD y SGR, en el departamento del Valle del Cauca.</u>Realizar las <u>mejoras, ajustes y actualizaciones al Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT – SAP donde se administra y opera el Banco de Programas y Proyectos de la gobernación del Valle del Cauca.</u>	
OBJETIVO: Consolidar la capacidad de gestión y respuesta a los procesos de formulación y estructuración de proyectos en el departamento del Valle del Cauca.	

Modulo de Datos Básicos - Completo

Después de verificar toda la información, se debe validar, dando clic aquí.



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2020 - 2024

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN)

Fecha Límite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

Datos Básicos del Proyecto



Datos Básicos

Periodo: 2024 - Febrero

[Ficha EBI \(14/07/2021\)](#)

Imagen [Cargar](#)

Resumen Ejecutivo ([Actualizar](#) [Borrar](#))

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

 spi.dnp.gov.co

Información Completa

OK

Resumen Ejecutivo ([Actualizar](#) [Borrar](#))

Modulo Presupuestal

Matriz de Ejecución Presupuestal – Z080



Proyecto	BPIN	Descripcion Proyecto	Descripcion PEP	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMIS	PAGOS	OBLIGACION
PI43101114	2020003760186	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Asistir técnicamente a los funcionarios de las entidades centralizadas y descentralizadas para la radicación, registro y, actualización de los proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos del	220.000.000	220.000.000	208.000.000	0	0
PI43101114	2020003760186	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Asesorar en la presentación, socialización, evaluación y viabilización técnica y financiera de proyectos de agua potable, saneamiento básico y aseo.	202.840.000	202.840.000	120.000.000	0	0
PI43101114	2020003760186	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Asistir en la formulación y estructuración de proyectos de inversión estratégicos para el Departamento del Valle del Cauca y la Región susceptibles de ser financiados y/o cofinanciados con recursos del PGD	5.186.120.000	186.120.000	160.700.000	0	0
PI43101114	2020003760186	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Realizar la revisión, actualización, intervención y aplicación de los instrumentos archivísticos para la gestión documental del Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación.	24.200.000	24.200.000	14.000.000	0	0
PI43101114	2020003760186	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión financiados y/o cofinanciados con recursos del PGD y SGR, en el departamento del Valle del Cauca.	184.800.000	184.800.000	163.500.000	0	0
PI43101114	2020003760186	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Asistir en la formulación y estructuración de proyectos de inversión estratégicos para el Departamento del Valle del Cauca y la Región susceptibles de ser financiados y/o cofinanciados con recursos del PGD	0	5.000.000.000	0	0	0

Archivo facilitado por la Subdirección de Inversión Pública. (varía según la vigencia a registrar)

Modulo Presupuestal



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Ejecución Presupuestal del Proyecto-
Vigencia



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2020 - 2

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.

Fecha Límite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

Periodo: 2024 - Febr

[Ficha EBI\(14/07/2](#)

☒ Ejecución Vigencia

☐ Reservas Presupuestales

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Privadas - - Recursos de gestión - Propios	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$11.365.700.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

- Ingresamos y validamos la información por fuente

Modulo Presupuestal – Recursos Propios



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA



	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Privadas - - Recursos de gestión - Propios	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$11.365.700.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	0,00	5817960000,00	500000000,00	0,00	0,00	0,00	Focalización

Registrar los **Compromisos** Presupuestales, las **Obligaciones** y los **Pagos** correspondientes a la Fecha de corte según la Matriz Excel - Z080



	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	0,00	5817960000,00	500000000,00	0,00	0,00	0,00	Focalización

Guardar la información

Modulo Presupuestal – Recursos Propios

Regionalización



¿Qué es la regionalización?

La regionalización de la inversión nacional es una aproximación de cómo las inversiones del Gobierno Nacional benefician a las poblaciones de los diferentes departamentos del país.

¿Qué se regionaliza?

Se regionalizan los proyectos de inversión pública que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), y se categorizan como regionalizables a partir de la información suministrada durante la formulación y estructuración del proyectos, en la etapa de preinversión en el proceso de identificación del proyecto donde se identifica la población que se encuentra afectada por el problema y la cuál será atendida con el proyecto.

FUENTE: DNP – GUIA PARA LA REGIONALIZACIÓN

Modulo Presupuestal – Recursos Propios

Regionalización



Regionalización de la Inversión

Tipo de Fuente	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00
Total Distribución Regional	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00

Distribución Regional


	Departamento	Municipio	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
			Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
	Valle	SIN MUNICIPIO	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00

Editar la información

Modulo Presupuestal – Recursos Propios


Regionalización

Distribución Regional


	Departamento	Municipio	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
			Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
	Valle	SIN MUNICIPIO	0,00	5817960000,00	5817960000,00	500000000,00	0,00	0,00

1. Procedemos a registrar todos los campos que se encuentran habilitados.

Como en este caso puntual TODOS los recursos están distribuidos en el Departamento del Valle del Cauca entonces los valores serán iguales a los que registramos anteriormente en los recursos propios (según la matriz presupuestal suministrada).



2. Guardamos el registro



3. Validamos

Modulo Presupuestal – Recursos Propios

Focalización



Qué es la Focalización?

La Ley 715 de 2001, en el artículo 94, y la Ley 1176 de 2007, en el artículo 24, define la focalización como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”.

La focalización no es, por tanto, la política social sino un instrumento básico para lograr que determinados programas destinados a grupos específicos lleguen efectivamente a la población escogida como objetivo.

FUENTE: DNP

Si al proyecto se le debe asociar una política social para hacer la focalización de los recursos, se hará de la siguiente manera

Focalizacion de Recursos por Fuente de Financiamiento

Clic Aquí

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiacion Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.

Fecha Limite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

Imagen pendiente

Fuente Financiación: Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios

Tipo de Fuente	Inicial	Ref. Valor Formulación	Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00

Política

Categoría

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Actividades de innovación

Modulo Presupuestal – Recursos Propios

Focalización



1. Se escoge la “Política”



2. Se escoge la “Categoría”

Modulo Presupuestal – Recursos Propios

Focalización



Focalizacion de Recursos por Fuente de Financiamiento



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiacion Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.

Fecha Límite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

Fuente Financiación: Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios

Tipo de Fuente	Inicial	Ref. Valor Formulación	Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00



3. Se guarda el registro



4. Se registra la Focalización


Modulo Presupuestal – Recursos Privados/Gestión



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$0,00	\$5.817.960.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Privadas - - Recursos de gestión - Propios	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$11.365.700.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

1. Registra cero “0” en los **Compromisos** Presupuestales, las **Obligaciones** y los **Pagos** correspondientes a los recursos de gestión, para que el sistema reconozca que se ingresaron datos
2. Guarda los datos

	Privadas - - Recursos de gestión - Propios	0,00	5547740000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$11.365.700.000,00	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

Modulo Presupuestal – Recursos Privados/Gestión Regionalización

Tipo de Fuente	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
Privadas - - Recursos de gestión - Propios	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Distribución Regional	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Distribución Regional



	Departamento	Municipio	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
			Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
	Valle	SIN MUNICIPIO	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Editar la información

Modulo Presupuestal – Recursos Privados/Gestión Regionalización



Distribución Regional

	Departamento	Municipio	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
			Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
 	Valle	SIN MUNICIPIO	0,00	5547740000,00	5547740000,00	0,00	0,00	0,00

1. Procedemos a registrar todos los campos que se encuentran habilitados.

Como en este caso puntual TODOS los recursos están distribuidos en el Departamento del Valle del Cauca entonces los valores serán iguales a los que registramos anteriormente en los recursos de gestión es decir cero “0” en compromisos, obligaciones y pagos



2. Guardamos el registro

spi.dnp.gov.co

Registro grabado. Distribución Regional Completa.
x- Información de regionalización completa.

OK

Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento



3. Validamos

spi.dnp.gov.co

x- Información de regionalización completa.

OK

Modulo Presupuestal – Recursos Privados/Gestión Regionalización





DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Si requieren incluir un campo o añadir información de la regionalización, suponiendo que la ejecución del proyecto esta asociada a unos municipios específicos deben realizar lo siguiente:

Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento



Distribución Regional

	Departamento	Municipio	Inicial	Ref. Valor Formulación	Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Valle	SIN MUNICIPIO	\$0,00	\$5.547.740.000,00	\$5.547.740.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Antioquia	SIN MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0

- Generaran otro campo y deberán completar la información asegurándose que los valores distribuidos sumen el valor total de los recursos que están registrados en la regionalización.
- Guardan y validan la información

Registro del avance de la ejecución del proyecto

Asociación y coherencia en el registro de la información de avance:

- En la medida en que haya avance en los indicadores de producto, debe haberse registrado la ejecución financiera de alguna de las actividades que hacen parte de éste.
- Si hay avance financiero en algunas de las actividades del producto, no necesariamente debe haber un avance físico, esto dado que la generación o entrega del producto puede darse más adelante en el tiempo.
- Es necesario que el avance de las actividades a nivel financiero estén acordes al cronograma definido dentro del plan de seguimiento.

Modulo Productos



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Indicadores de Producto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos


Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos





2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.

Fecha Límite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

Imagen pendiente

2020 - 2024

Periodo: 2024 - Febrero

[Ficha EBI \(14/07/2021\)](#)

OBJETIVO: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión pública radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca.

1.

PRODUCTO: Documentos de evaluación ... (Click para expandir)

2.

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2024	Meta Total Proyecto 2020 - 2024	Avance Acumulado 2020 - 2023	Meta Vigente 2024	Avance Vigencia 2024	Meta Rezagada 2023	Avance Rezago 2024	Regionalizable 2024	% Avance Vigencia 2024	% Avance Rezagado 2024	Observación Mensual?
	evaluación	Número - Número: Cantidad	100	100,0000	0	100,0000	0	0	0		0,00	0,00	


3.

OBJETIVO: Consolidar la capacidad de gestión y respuesta a los procesos de formulación y estructuración de proyectos en el departamento del Valle del Cauca.

Despliegan el producto de cada Objetivo
Editan la información

Modulo Productos

1. Verificar que tienen el valor correcto en “Meta Vigente”, si no es así deberán ajustar el proyecto en SUIFP
2. Registrar Avance
3. Registrar Observación mensual
4. Si tiene una Meta Rezagada de la vigencia anterior puede registrar también la información de la meta y el avance de la misma, de lo contrario dejar en “0”
5. Guardar

Indicador del Producto													
Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2024	Meta Total Proyecto 2020 - 2024	Avance Acumulado 2020 - 2023	Meta Vigente 2024	Avance Vigencia 2024	Meta Rezagada 2023	Avance Rezago 2024	Regionalizable 2024	% Avance Vigencia 2024	% Avance Rezagado 2024	Observación Mensual [?]
	459900100 ...os de evaluación s	Número - Número: Cantidad	100	100,000	0,0000	100,000	0,0000	0,0000	0,0000		0,00	0,00	

* La **meta rezagada** representa un valor que proviene del cierre del año inmediatamente anterior, el cual fue calculado bajo la operación de Meta Vigente – Avance Vigencia.

Fuente: DNP

Ejecución Física



Es importante recordar que si se requiere modificar la meta de la vigencia del indicador será necesario llevar a cabo una **actualización del proyecto en el SUIFP** mediante un ajuste sin tramite presupuestal.

Si el indicador muestra en la columna Meta Rezagada un valor mayor a cero, registre el avance rezagado alcanzado durante el periodo de registro en la columna “Avance Rezago”. La meta rezagada representa un valor que proviene del cierre del año inmediatamente anterior, el cual fue calculado bajo la operación de Meta Vigente – Avance Vigencia.

SUIFP - Ajustes sin trámite presupuestal de proyectos ya viabilizados

El sistema mostrará el encabezado del proyecto con la información básica y en la parte inferior la opción “Crear Solicitud”

Seleccione esta opción para el proyecto

Seleccione la opción “Confirmar Transacción” para continuar

El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el tipo de solicitud que se va a crear es “Sin trámite” debido a que no se va a ajustar los valores de los recursos en el capítulo de fuentes de financiación


Seleccione la opción “Aceptar” para continuar el proceso

SUIFP - Ajustes sin trámite presupuestal de proyectos ya viabilizados

Escoger o Cambiar de Rol

☐ Control de Viabilidad

☐ Control Posterior Viabilidad

☒ Formulator 

☐ Proyecto PPTO


☐ Reportes DIFP

Aceptar



FORMULADOR

SUIFP - Ajustes sin trámite presupuestal de proyectos ya viabilizados

**DNP** Departamento Nacional de Planeación

SUIFP
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

INICIO MIS PROYECTOS BPIN

Rol: Formulator

AJUSTES AL PROYECTO

MIS PROYECTOS

Buscar mis proyectos

jueves, 13 de julio de 2017 Administrador Suifp-Territorial

Salir Rol Clave Consultar Ayuda

VCENTAURADB SUIFP_REG 17-04-2017

Información Básica del proyecto

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Caldono, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda				BPIN	2017003190070			
Entidad	CAUCA								
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2017	Recursos	Fase proyecto	FACTIBILIDAD - FASE 3			
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural			Cargado por:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN				
Estado Proyecto	Registrado Actualizado			Estado Solicitud	Registrado Actualizado				

Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...

Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN		Vr Total SGR	0.00	Vr Total Propios	1,000,000,000.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	0.00				



SUIFP - Ajustes sin trámite presupuestal de proyectos ya viabilizados



The screenshot displays the SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) web application. The header includes the DNP (Departamento Nacional de Planeación) logo and the SUIFP title. The navigation menu on the left contains links for 'INICIO', 'MIS PROYECTOS', 'BPIN', 'AJUSTES AL PROYECTO', and 'Crear Solicitud'. The 'AJUSTES AL PROYECTO' link is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Crear Solicitud' button. The main content area shows the 'BPIN » AJUSTES AL PROYECTO' breadcrumb, the date 'jueves, 13 de julio de 2017', the user role 'Administrador Suifp-Territorial', and a 'Rol: Formulador' dropdown menu. The footer includes links for 'Salir', 'Rol', 'Clave', and 'Consultar Ayuda', along with a system message 'VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017'.

SUIFP - Ajustes sin trámite presupuestal de proyectos ya viabilizados



DNP Departamento Nacional de Planeación

SUIFP

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

INICIO MIS PROYECTOS BPIN

Rol: Formulatorio

- Horizonte
- Asociar Políticas Transversales
- Criterios de Focalización
- Fuentes de Financiación
- Programar costos de las actividades
- Indicadores de Producto
- Indicadores de Gestión
- Metas de Productos
- Actividades por Producto
- Documentos de Soporte
- Validar / Enviar
- Eliminar Solicitud

BPIN » AJUSTES AL PROYECTO

jueves, 13 de julio de 2017 Administrador Suifp-Territorial

Creación de Solicitudes de Ajustes

Salir Rol Clave Consultar Ayuda

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Caldon, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda				BPIN	2017003190070		
Entidad	CAUCA							
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2017	Recursos	Fase proyecto	FACTIBILIDAD - FASE 3		
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural				Cargado por:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
Estado Proyecto	Registrado Actualizado				Estado Solicitud	En actualización		
Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...								
Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN	Vr Total SGR	0.00	Vr Total Propios	1,000,000,000.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación				

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad	333347
Fecha	7/13/2017 10:43:05 AM
Tipo de Solicitud	Solicitud de Ajustes a proyectos viables

Modulo Productos



Repetiremos los pasos anteriores hasta completar el registro de información de todos los Indicadores de Producto asociados al proyecto

Indicadores de Producto

✓

Clic

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA2020 - 2024
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.
Fecha Límite de Registro: 30/03/2024
[Resumen Ejecutivo](#)

Periodo: 2024 - Febrero
[Ficha FBI\(14/07/2021\)](#)

OBJETIVO: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión pública radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca.

OBJETIVO: Consolidar la capacidad de gestión y respuesta a los procesos de formulación y estructuración de proyectos en el departamento del Valle del Cauca.

Validamos y Guardamos la información del Modulo de Productos

Modulo Actividades



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Programación y Seguimiento de
Actividades de Proyecto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos


Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos



 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Imagen pendiente	2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2020 - 2024
	Entidad Territorial: Entidad:	
	Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00	
	Responsable:	
	Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.	
	Fecha Límite de Registro: 30/03/2024	Periodo: 2024 - Febrero
	Resumen Ejecutivo	Ficha EB(14/07/2021)

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$0,00	\$11.365.700.000,00	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución

☐ Cronológico

OBJETIVO: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión pública radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca. [OBLIGADO = \$0]

PRODUCTO: Documentos de evaluación .. (Click para expandir) [OBLIGADO = \$0]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [Ⓢ]
	Inversión de Bienes y Servicios: Realizar la revisión, actualización, intervención y evaluación a los instrumentos archivísticos para la gestión documental del Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación.	\$217.450.000,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión financiados y/o cofinanciados con recursos del PGD y SGR, en el departamento del Valle del Cauca.	\$860.070.000,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar las mejoras, ajustes y actualizaciones al Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT - SAP donde se administra y opera el Banco de Programas y Proyectos de la gobernación del Valle del Cauca.	\$1.492.500.000,00		
	Total Producto	\$2.570.020.000,00	\$0,00	

Total: 3

OBJETIVO: Consolidar la capacidad de gestión y respuesta a los procesos de formulación y estructuración de proyectos en el departamento del Valle del Cauca. [OBLIGADO = \$0]

Desplegan hasta llegar a las actividades de cada Producto

Modulo Actividades



Todos ■	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [®]
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar la revisión, actualización, intervención y aplicación de los instrumentos	\$217.450.000,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión financiados y/o cofinanciados con recursos del PGD y SGR, en el departamento del Valle del Cauca.	\$860.070.000,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar las mejoras, ajustes y actualizaciones al Sistema de Gestión			

Edita la información de cada actividad apoyándose en la Matriz de Excel Z080

Se completan todos los campos habilitados y se resume el estado de cada actividad (avance, retraso o inconvenientes)

Se Guarda cada actividad conforme se reporta

Modulo Actividades



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Se repiten los pasos anteriores para todas las actividades del proyecto hasta que los valores de la tabla resumen estén completos (Obligación = Total Obligado Actividades)

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$0,00	\$9.867.050.000,00	\$589.900.000,00	\$111.000.000,00
Otras Fuentes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Registro Incompleto

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$0,00	\$9.867.050.000,00	\$589.900.000,00	\$589.900.000,00
Otras Fuentes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Registro Completo

☒ Ejecución

☐ Cronológico

OBJETIVO: Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos de inversión pública radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca.

[OBLIGADO = \$64.500.000]

OBJETIVO: Consolidar la capacidad de gestión y respuesta a los procesos de formulación y estructuración de proyectos en el departamento del Valle del Cauca.

[OBLIGADO = \$525.400.000]

PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica ... (Click para expandir)

[OBLIGADO = \$525.400.000]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
<input checked="" type="checkbox"/>	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer y articular institucionalmente a los actores de las entidades centralizadas y descentralizadas			

Modulo Actividades



Programación y Seguimiento de
Actividades de Proyecto



Validamos la Información

Gestión

Beneficiarios

Anexos



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.

Fecha Límite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$0,00	\$11.365.700.000,00	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

“Obligación” = “Total Obligado Actividades”

Módulo Completo

spi.dnp.gov.co

Información de actividades completa.

OK

Modulo Gestión



1. Verificar que tienen el valor correcto en “Meta Vigente”, si no es así deberán ajustar el proyecto en SUIFP
2. Definir el peso porcentual que se le asignará a cada indicador (Debe sumar 100%)
3. Registrar la información de cada indicador

Indicadores de Gestión

✓

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Anexos

➡



2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Entidad Territorial: Entidad:

Apropiacion Vigente 2024: \$11.365.700.000,00

Responsable:

Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.

Fecha Límite de Registro: 30/03/2024

[Resumen Ejecutivo](#)

2020 - 2024

Periodo: 2024 - Febrero

[Ficha EBI \(14/07/2021\)](#)

3

2

1

Todos 	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2024	Meta Vigente2024	Avance Vigencia2024	% Avance Vigencia2024	Observación Mensual 
	1000G110 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas-	Número- Número: Cantidad	0	1,0000	0,0000	0,00	
	1000G307 Entidades Capacitadas En Proyectos-	Número- Número: Cantidad	0	87,0000	0,0000	0,00	




Modulo Gestión

1. Registramos la información en todos los campos que se encuentran habilitados
2. Guardamos
3. Repetimos los pasos anteriores con los demás indicadores (si aplica)
4. Validamos la Información cuando esté completa

Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2024	Meta Vigente2024	Avance Vigencia2024	% Avance Vigencia2024	Observación Mensual [?]
 	1000G110 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	Número- Número: Cantidad	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>

2

1


Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2024	Meta Vigente2024	Avance Vigencia2024	% Avance Vigencia2024	Observación Mensual [?]
	1000G110 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	Número- Número: Cantidad	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
 	1000G307 Entidades Capacitadas En Proyectos	Número- Número: Cantidad	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="87,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>

3

Indicadores de Gestión



4

 spi.dnp.gov.co
 Información Completa

5

Modulo Gestión



Indicadores de Gestión



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Registro Completo



Modulo Beneficiarios





Es un modulo de consulta que trae la información del proyecto desde la MGA Web

Convenios

Datos Básicos Presupuestal Productos Actividades Gestión **Beneficiarios** Anexos



 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 	2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		2020 - 2024
	Entidad Territorial: Entidad:		
	Apropiacion Vigente 2024: \$11.365.700.000,00		
	Responsable:		
	Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.		
Fecha Límite de Registro: 30/03/2024		Periodo: 2024 - Febrero	
Resumen Ejecutivo		Ficha FBI(14/07/2021)	

Cuantificación y Localización .. (clic para expandir)

Población Afectada	4.475.886
Población Objetivo	4.475.886

Año: 2024

Región	Departamento	Cantidad de Beneficiarios

Crterios de Focalización .. (clic para expandir)

Anexos



Aquí se adjuntarán todos los documentos soportes y evidencias del proyecto en formato .pdf, .zip y .jpg.

[Ver Anexos](#)

Datos BásicosPresupuestalProductosActividadesGestiónBeneficiariosAnexos


DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente

2020003760186 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiación Vigente 2024: \$11.365.700.000,00
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/12/2023 04:58:36 p. m.
Fecha Límite de Registro: 30/03/2024
[Resumen Ejecutivo](#)

Anexar Documento  (anexos disponible para este periodo es: 50 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Periodo	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
 				<input type="text"/>	Examinar...	No se ha seleccionado ningún archivo.



Recordar

- Las dependencias deberán reportar mensualmente al sistema que administra el DNP (SPI) el avance logrado por el proyecto durante ese periodo.
- El reporte se debe hacer los 5 primeros días hábiles de cada mes.
- El Banco de Programas y Proyectos verifica la oportunidad y calidad de la información de avance reportada.

Gracias

Gianna Catalina Storino Angel
gcstorino@valledelcauca.gov.co
6200000 ext 1260



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

Gobernación del Valle del Cauca

Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco

Call Center: +57 (602) 620 00 00

contactenos@valledelcauca.gov.co

www.valledelcauca.gov.co
